


## Controlling Bericht (per 16.04.2026)



Das vorliegende Dokument beschreibt den Stand der Semesterarbeit per 16.04.2026 mit den wesentlichen Abweichungen zur Planung, ihren Ursachen und den allfälligen notwendigen Massnahmen für eine erfolgreiche Zielerreichung sowie den wesentlichen aktuellen Risiken.

### 1. Planung des Projektes

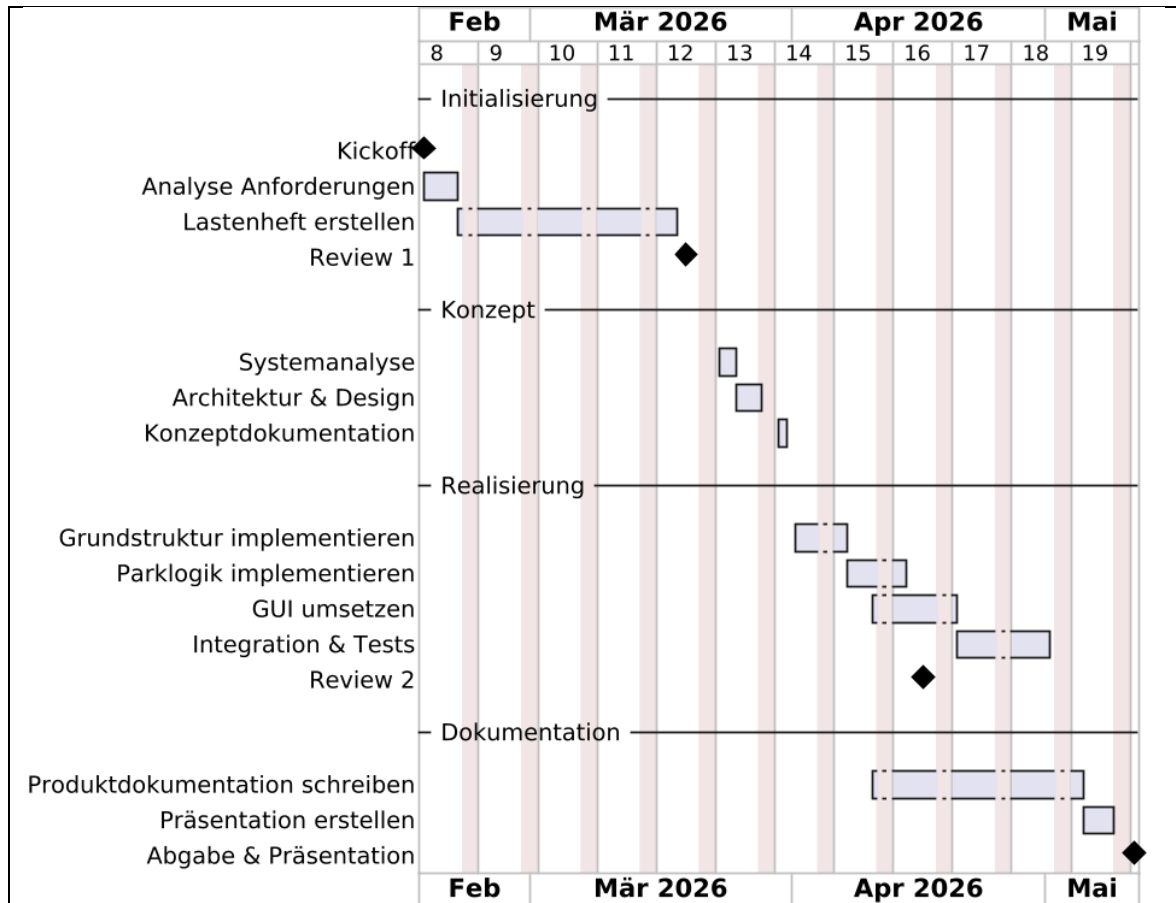

### 2. Aktueller Stand des Projektes

Geplant wäre zu diesem Zeitpunkt eine abgeschlossene Konzeption und fortgeschrittene Realisierung inkl. Produktdokumentation. Tatsächlich ist das Produkt fast fertig und (automatische) Tests waren grösstenteils erfolgreich. Eine erste Version der Produktdokumentation wurde erstellt, muss jedoch noch verfeinert werden.

### 3. Abweichungen

Leicht dem Zeitplan voraus.

### 4. Aufgetretene Probleme

Die Tasks in der Realisierungsphase im Zeitplan wurden parallel und nicht sequenziell wie geplant durchgeführt. Z.B. sind die Tests gemäss Zeitplan am Ende der Realisierung durchzuführen, wobei die automatisierten Tests von Anfang an mitentwickelt wurden. Eine andere Aufteilung von Tasks wäre sinnvoll für ein zukünftiges Projekt.

### 5. Risiken

Das primäre Risiko stellt weiterhin das Nichteinhalten des Zeitplans dar. Um den Zeitplan einzuhalten, wird konsequent mindestens 2 Tage pro Woche für das Projekt eingeplant.

## 6. Nächste Aktivitäten

Für die Realisierung werden als nächstes die manuellen Tests durchgeführt und anschliessend finale Anpassungen gemacht.

Ausserdem wird ein finaler Abgleich mit den initialen Anforderungen und dem erstellten Konzept gemacht, um sicher zu gehen, dass nichts übersehen wurde.

Für die Dokumentation muss das Kapitel Realisierung überarbeitet und mit dem finalen Stand des Produktes aktualisiert werden.

## 7. Notwendige Massnahmen

Aktuell sind keine Massnahmen eingeplant.
